

Avril 2025

MENU MAKER by Qwenta

Tableau Kanban




SOMMAIRE

- 01 Outil utilisé pour réaliser le Kanban
- 02 Pourquoi et comment organiser son tableau ?
- 03 Découpage du projet en fonctionnalités/tâches
- 04 Point sur le tableau Kanban (captures d'écran)
- 05 Qu'est-ce que la méthodologie Scrum ?
- 06 Composition de l'équipe agile et définition des rôles
- 07 Quelques points de réflexion supplémentaires
- 08 Conclusion



Outil utilisé pour réaliser le Kanban

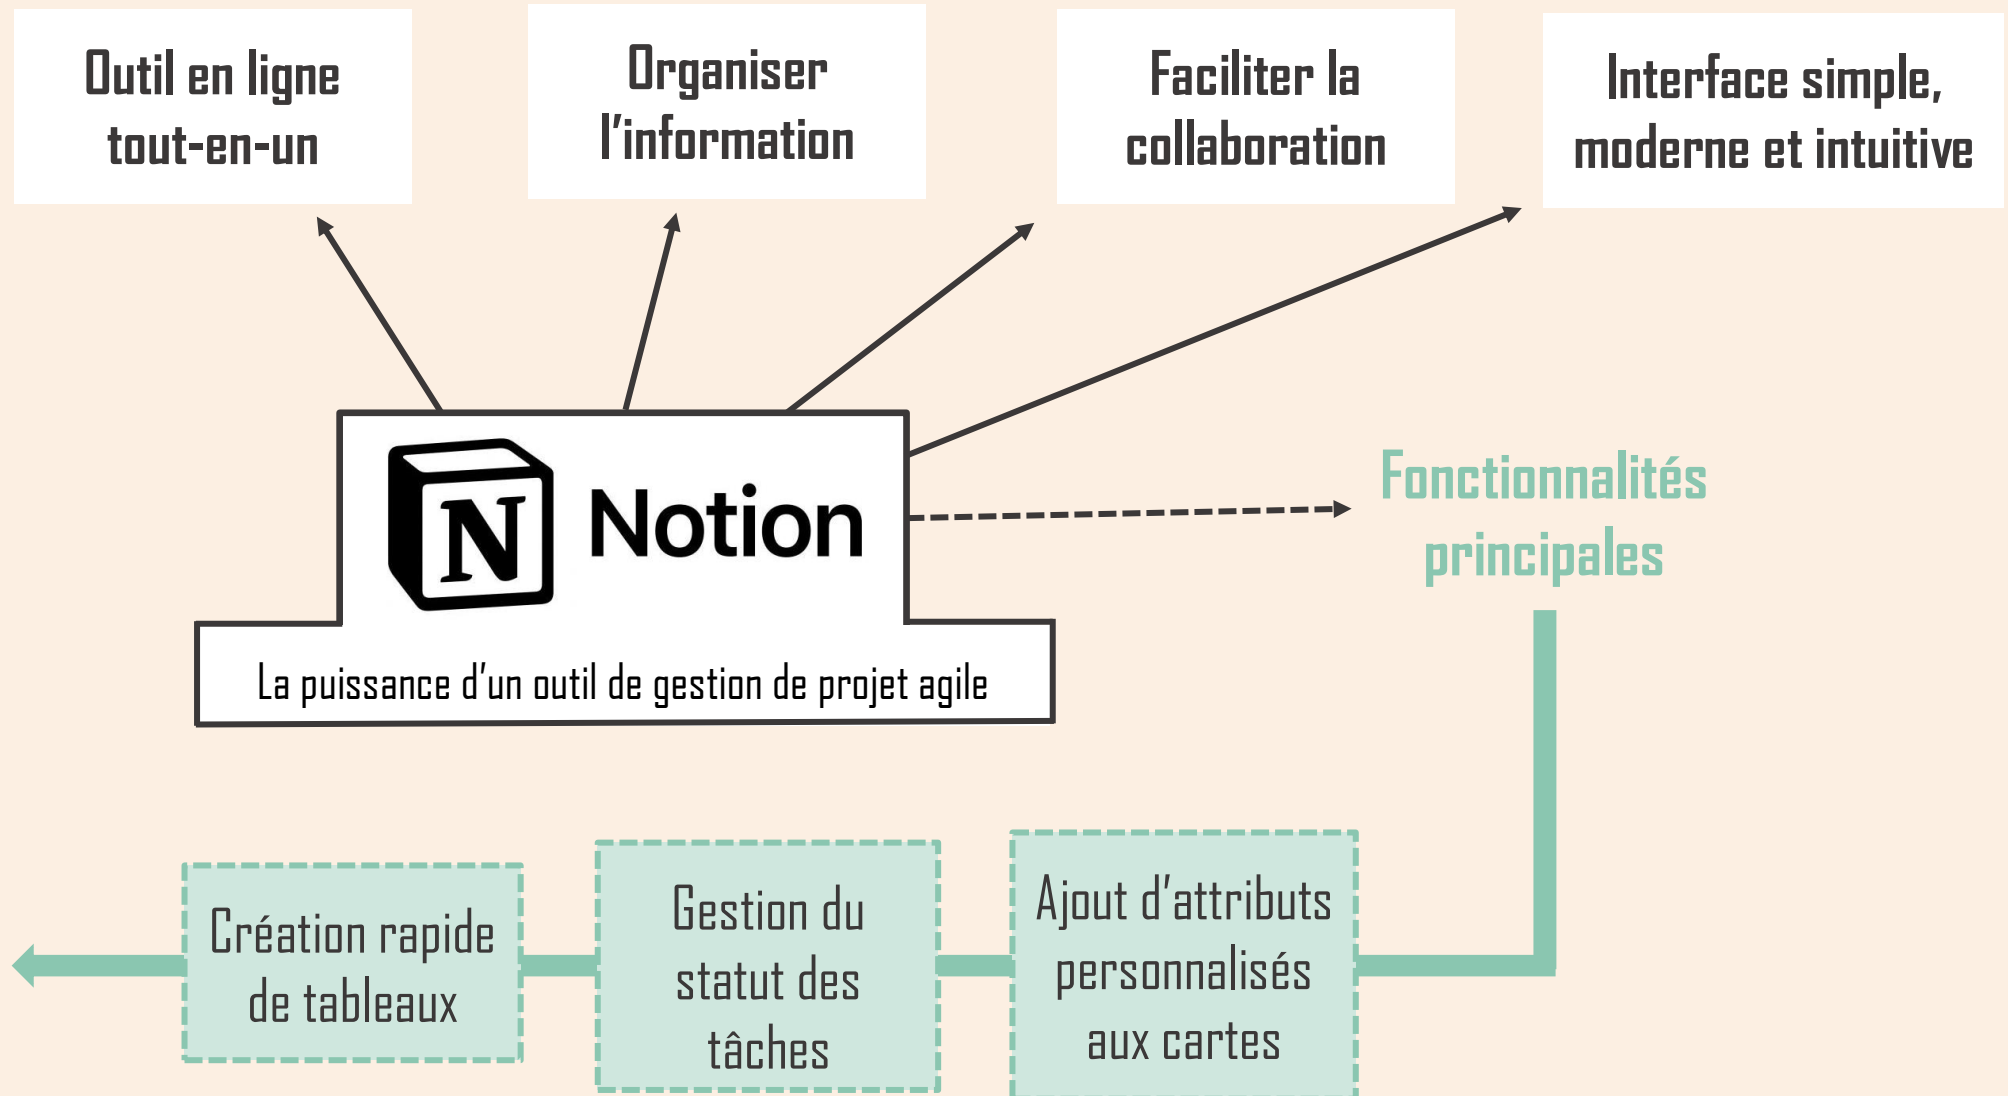

Pourquoi et comment organiser son tableau ?

POURQUOI ?

Faciliter le suivi en temps réel

Adopter une gestion agile

Favoriser la collaboration

Découper facilement le projet

Prioriser et sécuriser l'avancement

COMMENT ?

Le tableau est divisé en 4 colonnes : « A faire », « En cours », « A tester » et « Terminé ». Le tableau est composé de carte. Chaque carte représente une tâche à faire dans le projet et contient les informations suivantes :

- > Un titre clair de la tâche à réaliser
- > La fonctionnalité clé à laquelle appartient la tâche
- > Une timeline estimée et un niveau de complexité
- > Les attributaires de la carte et une description de leur rôle
- > Le jalon agile auquel appartient la tâche (OPTIONNEL)
- > Une User Story et une description précise de la tâche
- > Les critères de réussite pour considérer la tâche comme étant « Terminée »

Pourquoi découper le projet en fonctionnalités et en tâches

Gérer la complexité

- > Un projet complet ne peut pas être traité d'un seul bloc
- > Le découpage permet de rendre le travail abordable et progressif

Faciliter l'estimation et la planification

- > Estimer la durée d'une grande fonctionnalité est difficile
- > Estimer une petite tâche concrète est beaucoup plus fiable

Travailler en itérations (sur la méthode de Spints)

- > Chaque Sprint doit produire des livrables fonctionnels
- > Le découpage permet d'assurer qu'on livre de la valeur à chaque Sprint

Limiter les risques

- > Plus les tâches sont petites, plus on détecte tôt les erreurs, les imprévus et les besoins d'ajustements

Comment procéder au découpage ?

01

Identifier les grandes fonctionnalités du projet

Exemples de fonctionnalités : l'authentification, la gestion des menus, l'export et la diffusion, etc.

02

Découper chaque fonctionnalité en tâches actionnables

-> Une tâche doit être réalisation en un à deux jours grand maximum idéalement

-> Chaque tâche doit avoir un résultat observable (par exemple la création d'une modale

03

Respecter une logique agile

-> PENSER EN VALEUR UTILISATEUR : Chaque tâche doit rapprocher d'une fonctionnalité utilisable

-> DÉCOUPER EN VERTICALE : Penser en partie complète fonctionnelle plutôt qu'en séparation front et back

Un point sur le tableau Kanban

Vue globale du Kanban sur Notion

The screenshot shows a Notion Kanban board titled "Kanban Menu Maker". The board is organized into four columns: "A FAIRE" (29 items), "EN COURS" (0 items), "A TESTER" (0 items), and "TERMINÉ" (1 item). Each column has a "Nouvelle page" button. The "A FAIRE" column contains five tasks: "Organiser la session de formation Scrum et composer l'équipe projet", "Rédiger le fichier README.md", "Mettre en place les conventions de nommage et d'architecture", "1 Installation et configuration de Node.js, MongoDB et Git", and "1 Définir les modèles Mongoose". The "TERMINÉ" column contains one task: "Créer un Kanban clair pour le projet".

Kanban Menu Maker

Vue « tableau kanban »

A FAIRE 29

- Organiser la session de formation Scrum et composer l'équipe projet
- Rédiger le fichier README.md
- Mettre en place les conventions de nommage et d'architecture
- 1 Installation et configuration de Node.js, MongoDB et Git
- 1 Définir les modèles Mongoose
- 1 Créer la landing page de présentation

EN COURS 0

+ Nouvelle page

A TESTER 0


+ Nouvelle page

TERMINÉ 1

- Créer un Kanban clair pour le projet

+ Nouvelle page

Zoom sur une carte du Kanban

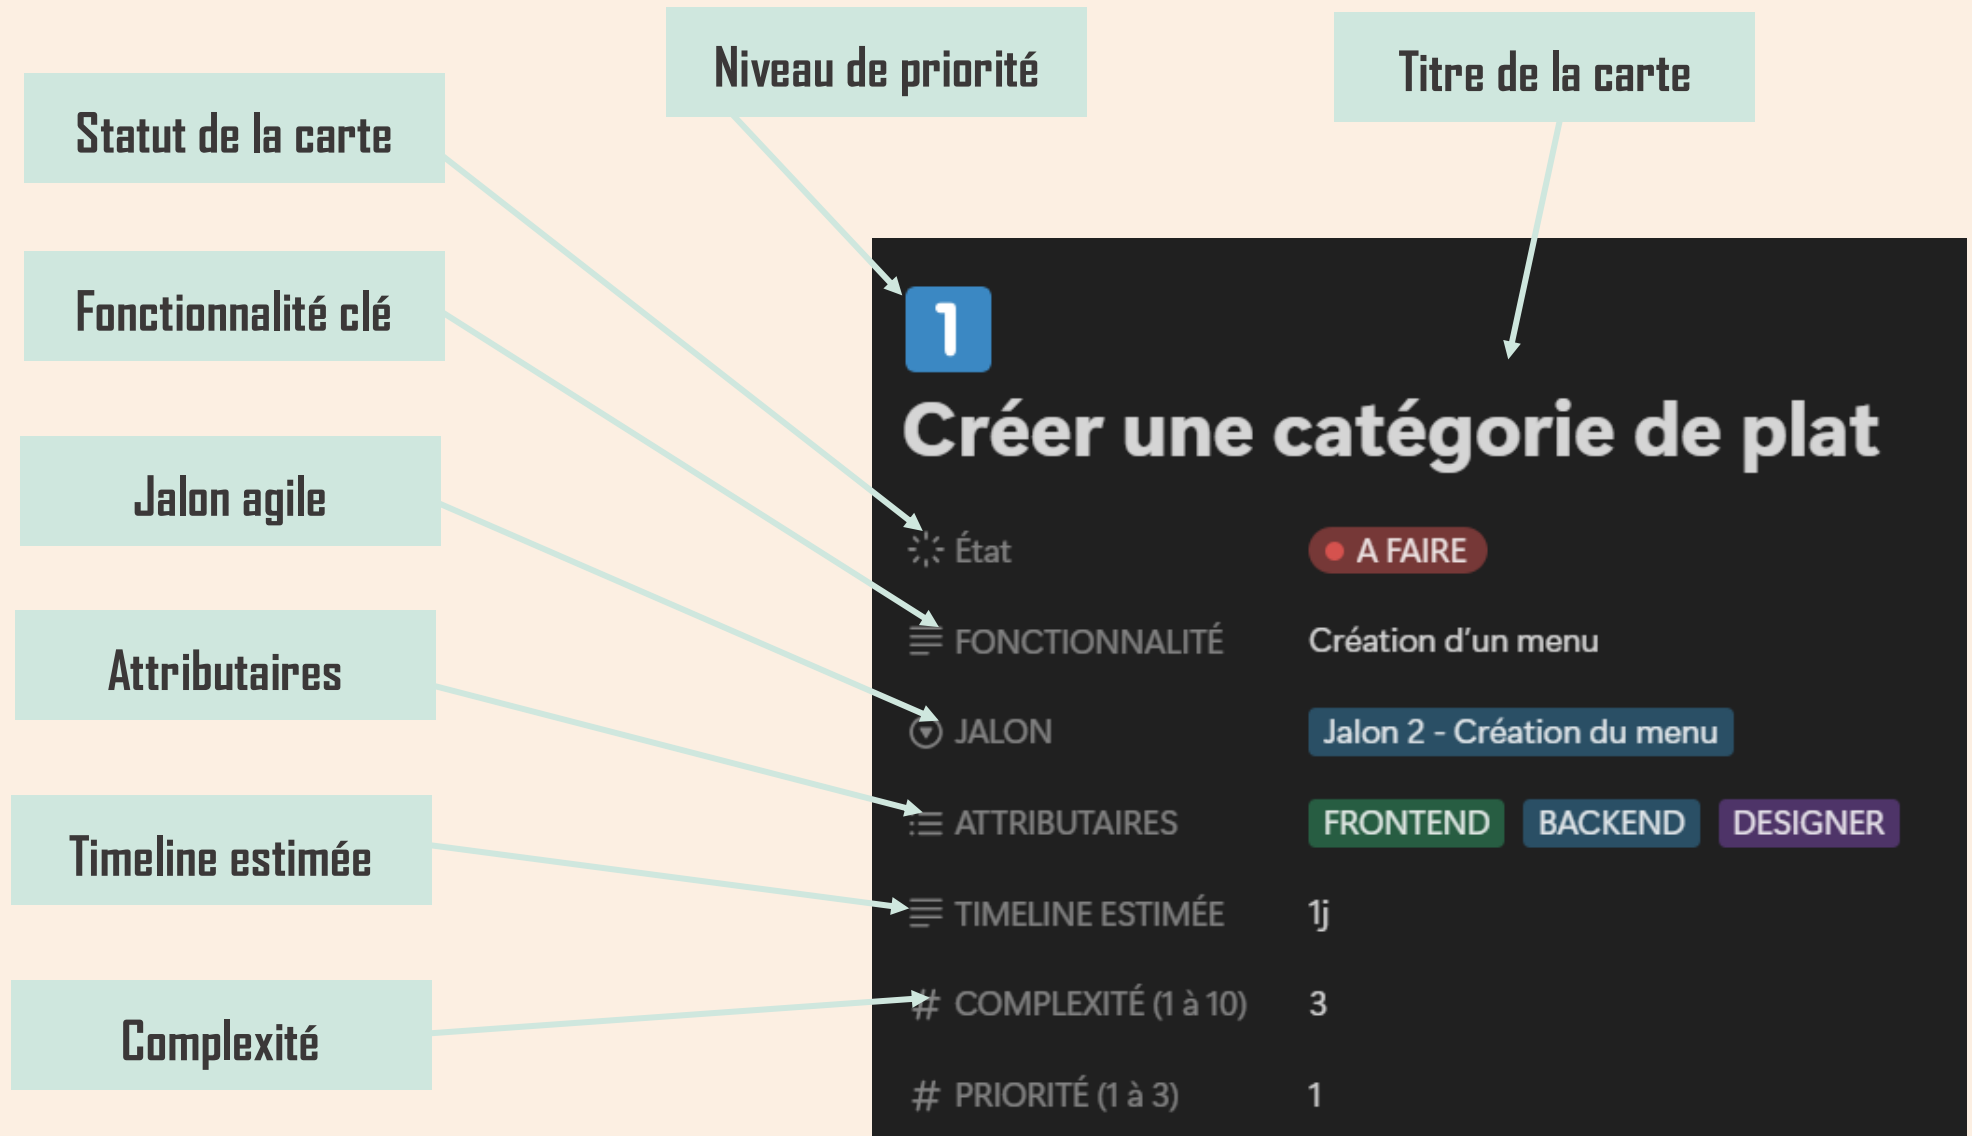

Le détail d'une carte

Attribution des rôles

FRONTEND :

- Création de l'interface utilisateur par l'intégration de la maquette du bouton et de la modale
- Gestion de l'affichage dynamique de la nouvelle catégorie
- Création de l'interaction avec l'API

DESIGNER :

- Conception de la maquette de la modale

BACKEND :

- Création d'une route API pour recevoir la nouvelle catégorie envoyée par le frontend
- Vérification des données reçues
- Enregistrement de la catégorie dans la base de données MongoDB via un modèle Mongoose
- Retour d'une réponse JSON au frontend pour confirmer que l'ajout à réussi ou signaler une éventuelle erreur

Description précise

Développer un bouton pour ouvrir une modale contenant un champ de texte pour l'ajout d'une nouvelle catégorie ("Nom de la catégorie") ainsi qu'un bouton pour valider l'ajout.

User story

En tant que restaurateur inscrit, je veux pouvoir renseigner une catégorie de plats (*ex : Entrées, Plat, Dessert...*).

Succès

- ☐ Intégration de la maquette
- ☐ Créer un bouton "Ajouter une catégorie"
- ☐ La modale doit s'afficher sans impliquer un rechargement de la page
- ☐ La modale doit contenir un champ de saisie et un bouton de validation
- ☐ L'affichage est immédiat dans l'interface après l'ajout d'un plat


Le restaurateur connecté doit pouvoir :

- ☐ Créer une nouvelle catégorie sur le menu
- ☐ Sélectionner une catégorie déjà créée
- ☐ Une fois validée, la nouvelle catégorie est ajoutée à la base de données

Pièces jointes

 Lien vers les maquettes Figma

Qu'est-ce que la méthodologie Scrum ?

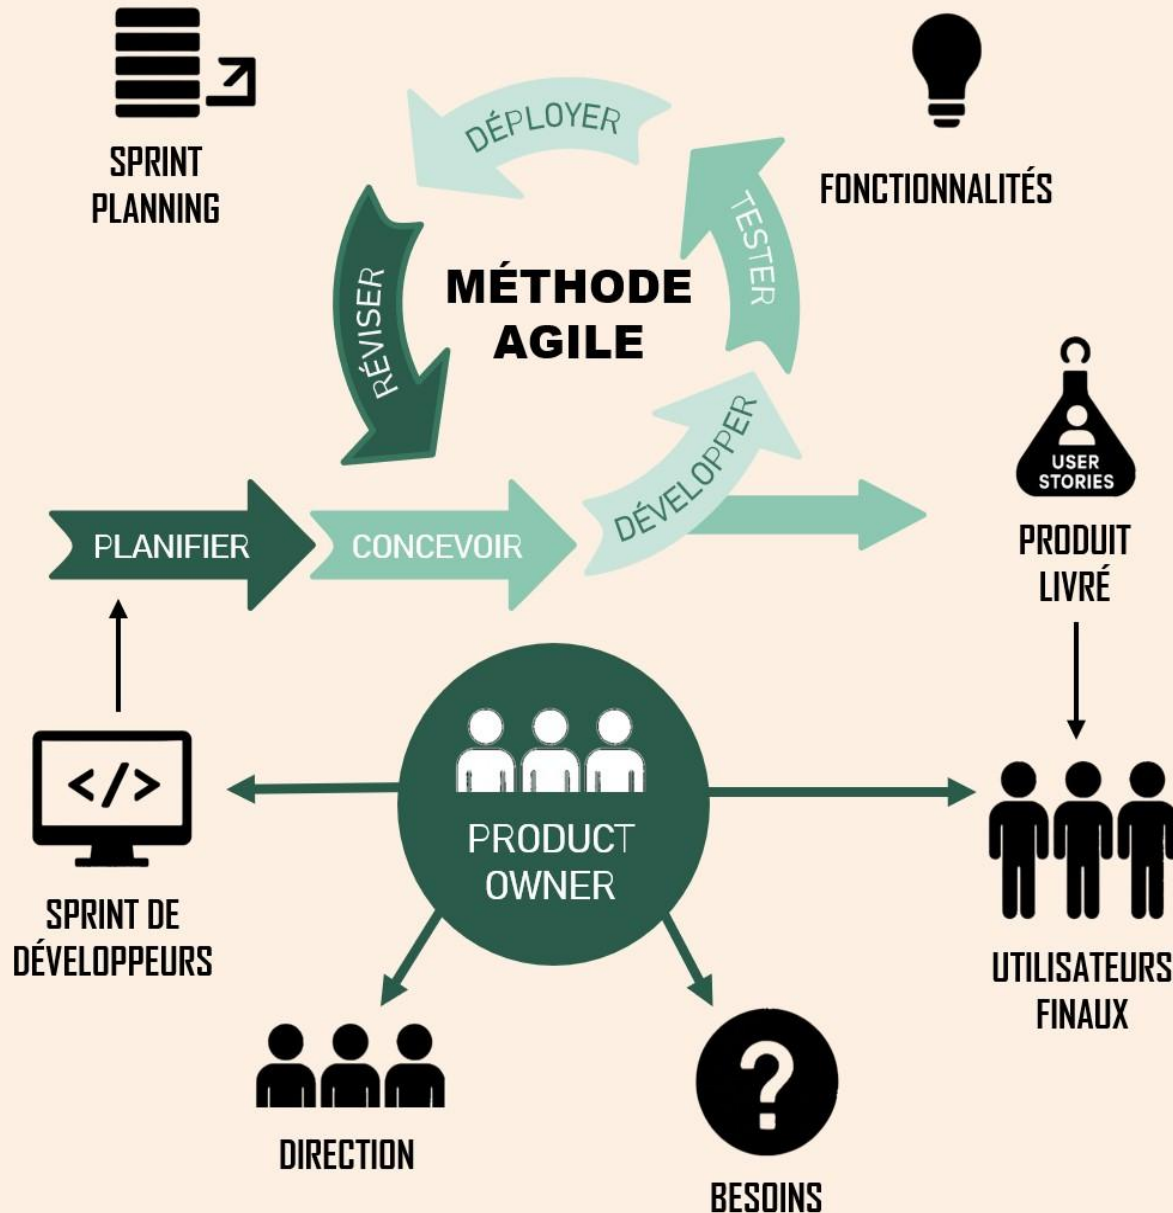

Travail par Sprints courts et itératifs

Daily Meeting pour synchroniser l'équipe

Sprint Planning, Sprint Review ou Sprint Rétrospective pour planifier, livrer et s'améliorer


Le Product Owner définir les priorités et la vision du produit

Le Scrum Master facilite l'application de Scrum et résout les blocages

L'objectif est de livrer un produit fonctionnel à chaque fin de Sprint

Organisation de l'équipe agile

Chaque rôle contribue à répondre aux besoins du projet dans une dynamique agile

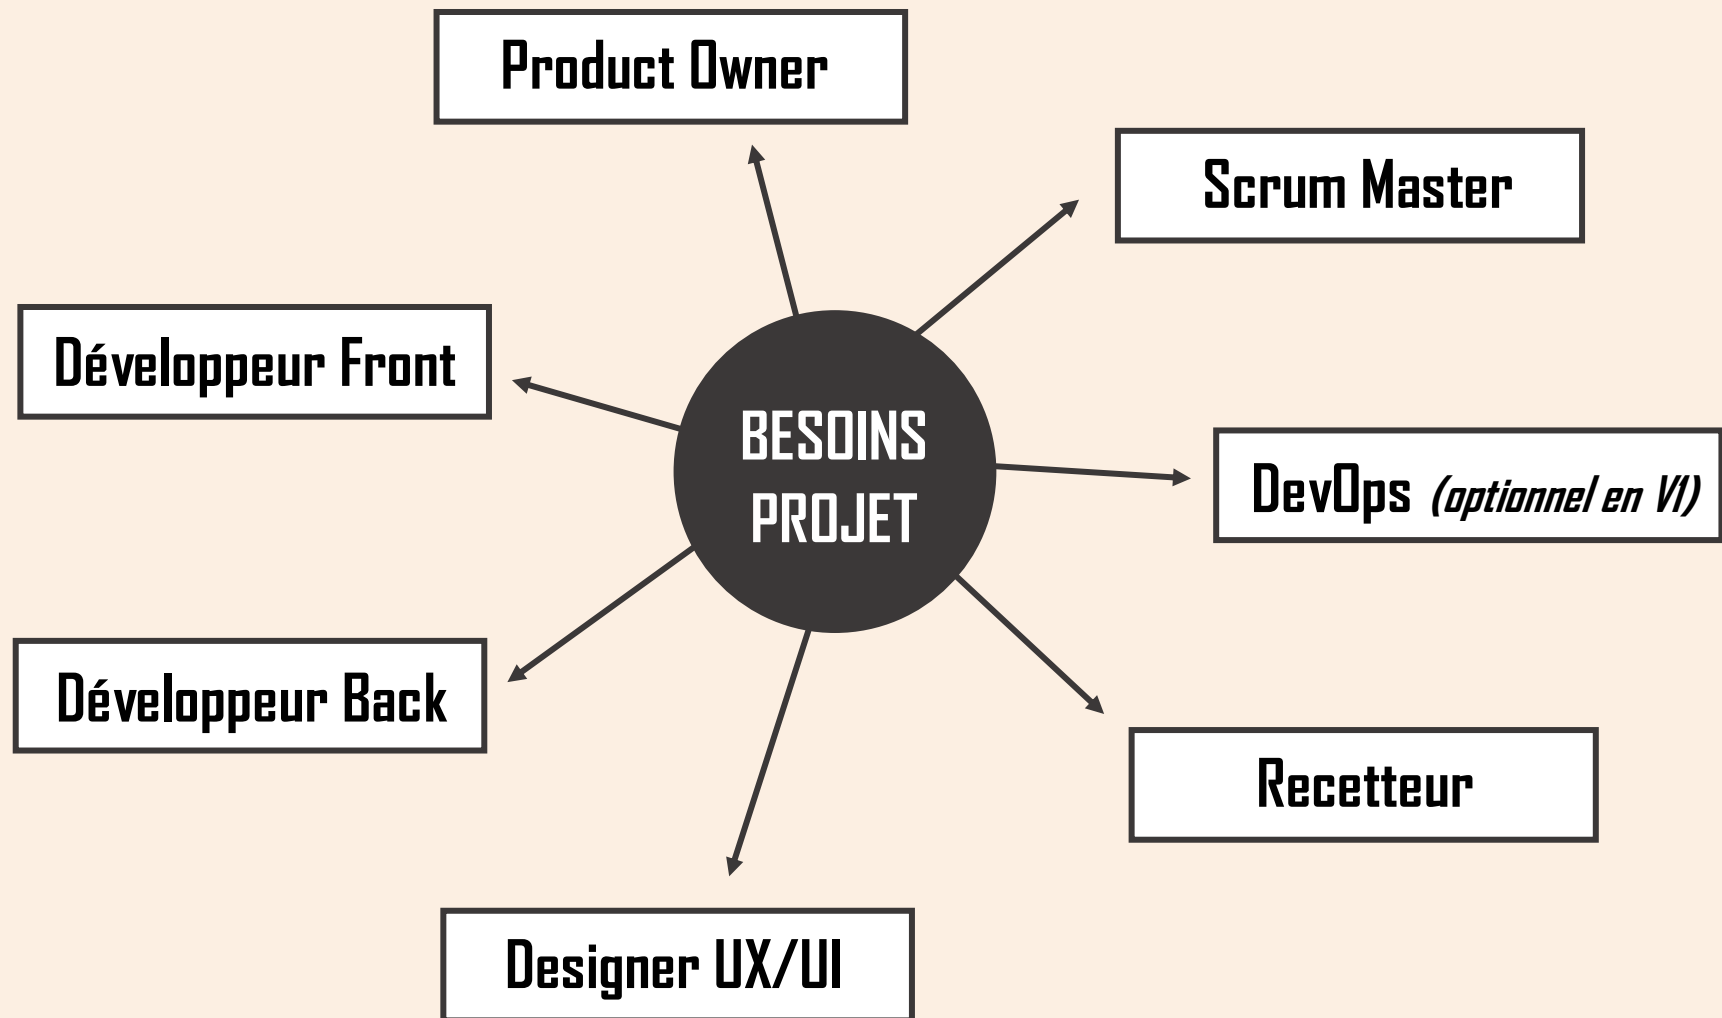

Quelques points de réflexions supplémentaires

PRIORISATION DES TÂCHES

La bonne organisation du tableau Kanban repose sur une priorisation claire. Certaines tâches sont plus critiques que d'autres. La gestion de la priorité est donc essentielle pour livrer rapidement un produit fonctionnel.

DÉFINITION DES CRITÈRES DE SUCCÈS

Pour éviter toute ambiguïté, chaque tâche du Kanban doit contenir des critères de validation précis. Cela évite les malentendus et améliore la qualité du livrable.

Il faut donc se demander : Quand considère-t-on qu'une tâche est « vraiment » terminée ?

SYNCHRONISATION QUOTIDIENNE

Même avec un Kanban, la communication quotidienne reste essentielle. Le Daily Scrum permet de lever les obstacles, d'ajuster les priorités si besoin et d'assurer que tout le monde avance à bon rythme.

ADAPTABILITÉ et ITÉRATIONS COURTES

La force de l'agilité et de Scrum c'est aussi de savoir s'adapter rapidement :

- > Le Kanban doit pouvoir évoluer si les besoins changent
- > Les itérations doivent permettre d'intégrer des retours réguliers

CONCLUSION

- 01 Utilisation de Notion pour créer un Kanban clair et collaboratif
- 02 Organisation rigoureuse pour suivre l'avancement agile du projet
- 03 Découpage précis en fonctionnalités et tâches concrètes
- 04 Application de la méthodologie Scrum pour avancer par Sprints courts
- 05 Définition claire des rôles dans l'équipe agile
- 06 Priorisation, critères de succès et communication quotidienne assurent réussite

LIEN VERS LE TABLEAU KANBAN

<https://www.notion.so/lca06832e68f808c86b1fa082adf0d7a?v=lca06832e68f8094a4d5000cb0e55245>

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU KANBAN

(toutes les cartes sont encore dans la colonne du tableau « A faire »)

CARTES DU KANBAN	PRIORITÉ	TIMELINE ESTIMÉE	COMPLEXITÉ	ATTRIBUTAIRES	FONCTIONNALITÉ PRINCIPALE
Organiser la session de formation Scrum et composer l'équipe du projet	1/3	0,5 jour	03/10	Product Owner Scrum Master	ÉQUIPE AGILE
Rédiger le fichier README.md	1/3	0,5 jour	02/10	Développeur Frontend Développeur Backend Product Owner	DOCUMENTATION DU PROJET
Mettre en place les conventions de nommage et d'architecture	1/3	0,5 jour	02/10	Développeur Frontend Développeur Backend Product Owner	DÉFINIR LES STANDARD DU PROJET
Installation et configuration de Node.js, MongoDB et Git	1/3	1 jour	02/10	Développeur Frontend Développeur Backend	PRÉPARER L'ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT
Définir les modèles Mongoose	1/3	1 jour	04/10	Développeur Backend	BASE DE DONNÉES
Créer la landing page de présentation	1/3	0,5 jour	02/10	Développeur Frontend Designer	PAGE D'ACCUEIL
Mettre en place l'authentification sécurisée	1/3	2,5 jours	06/10	Développeur Frontend Développeur Backend	AUTHENTIFICATION / SÉCURITÉ
Créer la page de connexion (Login Page)	1/3	1 jour	03/10	Développeur Frontend	AUTHENTIFICATION / CONNEXION
Créer une catégorie de plat	1/3	1 jour	03/10	Développeur Frontend Développeur Backend Designer	CRÉATION D'UN MENU

Ajouter un plat sur le menu	1/3	1 jour	05/10	Développeur Frontend Développeur Backend Designer	CRÉATION D'UN MENU
Gestion des plats sur le menu	1/3	1 jour	05/10	Développeur Frontend Développeur Backend	CRÉATION D'UN MENU
Mise en page du menu	1/3	0,5 jour	04/10	Développeur Frontend Designer	CRÉATION D'UN MENU
Menus précédents	1/3	1 jour	04/10	Développeur Frontend Développeur Backend	GESTION DES MENUS
Implémenter la génération des menus au format PDF	1/3	1 jour	06/10	Développeur Frontend Développeur Backend	EXPORTATION et DIFFUSION
Impression d'un menu	1/3	0,5 jour	03/10	Développeur Frontend	IMPRESSION
Mise en place de l'hébergement et SSL	2/3	0,5 jour	03/10	Développeur Backend OU DevOps	HÉBERGEMENT
Mise en place de la sécurité	2/3	1,5 jours	07/10	Développeur Frontend Développeur Backend	SÉCURITÉ
Créer l'interface Dashboard	2/3	0,5 jour	03/10	Développeur Frontend	DASHBOARD
Implémenter l'accès aux tarifs de l'outil	2/3	0,25 jour	02/10	Développeur Frontend	TARIFS
Mettre en place la fonctionnalité de déconnexion	2/3	0,5 jour	02/10	Développeur Frontend Développeur Backend	AUTHENTIFICATION / DÉCONNEXION
Développer l'édition des informations utilisateurs	2/3	0,5 jour	04/10	Développeur Frontend Développeur Backend	INFORMATIONS UTILISATEURS
Connexion à l'API Deliveroo	2/3	1 jour	07/10	Développeur Frontend Développeur Backend	EXPORTATION ET DIFFUSION

Générer des images adaptées pour Instagram	2/3	1 jour	07/10	Développeur Frontend Développeur Backend	EXPORTATION ET DIFFUSION
Implémenter la modale des mentions légales	2/3	0.25 jour	02/10	Développeur Frontend	MENTIONS LÉGALES
Achat et configuration du nom de domaine	3/3	0,5 jour	02/10	Développeur Frontend DevOps	DOMAINE
Mise en place de l'accessibilité sur l'outil	3/3	0,5 jour	04/10	Développeur Frontend	ACCESSIBILITÉ
Mise en place de la gestion du branding restaurateur	3/3	1 jour	03/10	Développeur Frontend Développeur Backend Designer	BRANDING RESTAURATEUR
Effectuer le nettoyage final du projet	3/3	0,5 jour	03/10	Développeur Frontend Développeur Backend Product Owner	OPTIMISATION FINALE
Vérification et finalisation de toutes les maquettes	3/3	1,5 jours	03/10	Designer Product Owner	MAQUETTES SUPPORTS
